



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**Reunión de la Comisión de
Implementación – 07/10/2021-08:10 hs.**

Minuta N°11

En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, siendo las 08:10 hs., se reúne la Comisión de Seguimiento para la Implementación del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes en la Sala de Presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, integrado por los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Dr. Eduardo G. Panseri y el Dr. Alejandro A. Chain de manera presencial, junto a los Dres. Horacio Ortega Ministro de Planificación y Coordinación en representación del Poder Ejecutivo, Marcelo E. Chain representante de la Cámara de Diputados de Corrientes, y Gustavo Robineau Fiscal de Instrucción N° 6 de esta ciudad de Corrientes conectados remotamente a través de Cisco Webex, asistidos por la Sra. Secretaria Dra. María Juliana Ojeda, de acuerdo al Art. 482 Disposiciones Transitorias de la Ley N° 6.518. Se da inicio a la reunión exponiendo el Dr. Panseri que el motivo de la presente es dar a conocer los planos con la información respectiva de cada obra iniciada y/o por iniciarse en las distintas circunscripciones judiciales en el marco de la implementación del CPPC.

-Monte Caseros: OBRA EN EJECUCIÓN, SUPERFICIE: 709 m2 – PLAZO DE OBRA: 180 DÍAS, MONTO DE OBRA: \$69.985.006,40. El monto que se lleva pagado es de \$ 48.148.255,52, según certificado cinco. Han trabajado más de 46 obreros

LOCALES


- ✓ OFIJU
- ✓ Juzgado de Garantías



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

- ✓ Dos (2) Salas de Audiencias
- ✓ Cámara Gessell
- ✓ Cuerpo Interdisciplinario Forense (Médico, Psicólogo y S. Social)
- ✓ Mandamiento y Notificaciones
- ✓ Depósito de Elementos Secuestrados
- ✓ Centro de Cableado
- ✓ Sanitarios Hombre/ Mujer/ Inclusivo
- ✓ Garita Policial
- ✓ Patios

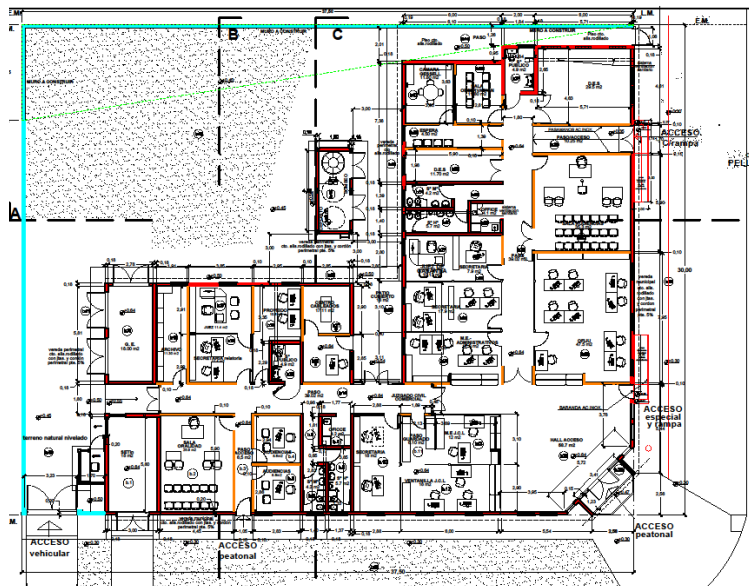

La fecha de entrega de la obra sería el 30 de octubre más 15 o 20 días para que la Dirección de Informática debe equipar con cableado y equipamiento tecnológico el lugar. De acuerdo a lo informado por la Dirección de Arquitectura el avance de obra es de un 78% y posible inauguración a partir del 20 de noviembre.

-Bella Vista: OBRA EN EJECUCIÓN, SUPERFICIE: 1.860 m² – PLAZO DE OBRA: 240 DÍAS, MONTO DE OBRA: \$132.483.001,83. El monto pagado a la fecha es de \$25.000.000 y el porcentaje de ejecución de obra es de 8%.

LOCALES

- ✓ OFIJU
- ✓ Juzgado de Garantías
- ✓ Dos (2) Salas de Audiencias
- ✓ Cámara Gessell
- ✓ Cuerpo Interdisciplinario Forense (Médico, Psicólogo y S. Social)




Superior Tribunal de Justicia

Corrientes


- ✓ Mandamiento y Notificaciones
- ✓ Depósito de Elementos Secuestrados
- ✓ Centro de Cableado
- ✓ Sanitarios Hombre/ Mujer/ Inclusivo
- ✓ Garita Policial
- ✓ Patios

MINISTERIO PÚBLICO

- ✓ UNIDAD FISCAL
- ✓ UNIDAD DE LA DEFENSA
- ✓ MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

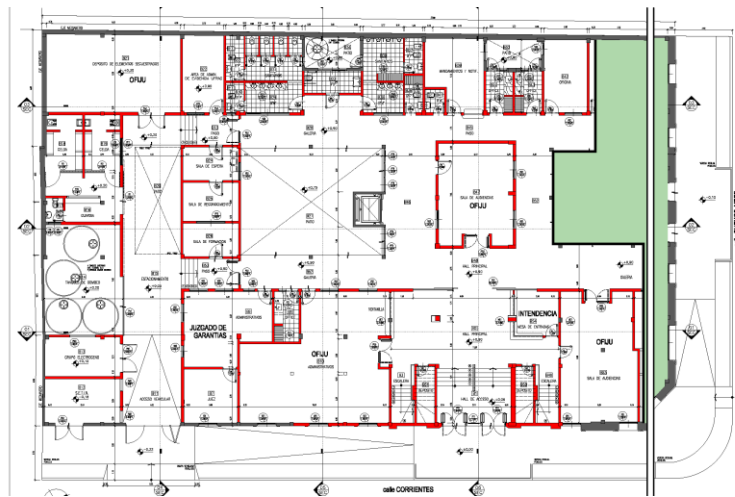

PLANTA BAJA

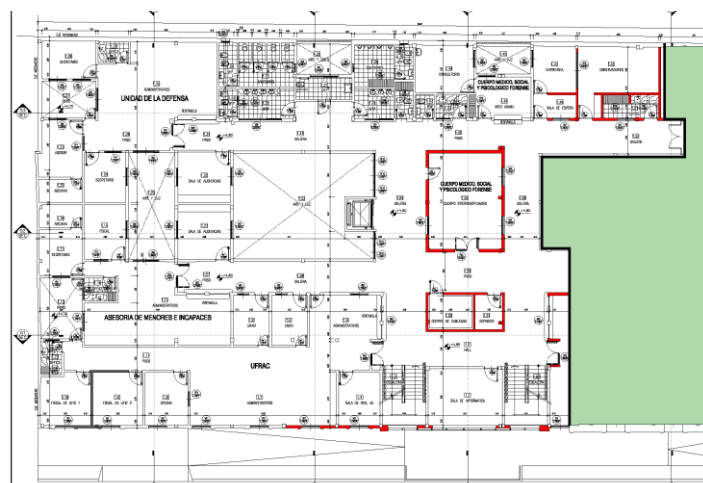

PRIMER PISO




Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

En el mencionado proyecto, se respetaron las estructuras y formas que llevan el valor arquitectónico que posee el edificio para la Provincia de Corrientes. En igual sentido aclara que todos los edificios judiciales tendrán similitudes por un estilo común, si bien este edificio será el que contenga más características de majestuosidad, a grandes rasgos se ven modificadas las estructuras de construcción que se venían realizando, ya lo nuevo es que se dividen en una gran sala o áreas de trabajo donde están todos los trabajadores y eliminando las paredes por mamparas vidrios, un área reservada a los jueces, fiscales, asesores y/o defensores (despachos) y para el médico en su consulta. Así también contara con un área separada para cámara gessell, entrevistas de fiscales y audiencias. La obra se lleva a cabo por 50 obreros prevaleciendo de la localidad los mismos, se pretende concluir dentro de 7 meses para abril del 2022.

-Saladas: OBRA NUEVA, SUPERFICIE: 725 m² – PLAZO DE OBRA: 240 DÍAS, MONTO DE OBRA: \$ 71.207.271,74,

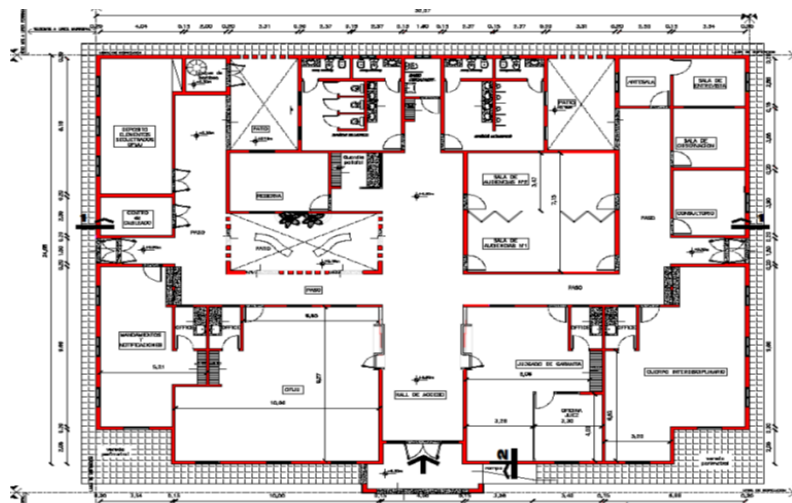

LOCALES:

- ✓ OFIJU
- ✓ Juzgado de Garantías
- ✓ Dos (2) Salas de Audiencias



Superior Tribunal de Justicia


Corrientes

- ✓ Cámara Gessell
- ✓ Cuerpo Interdisciplinario Forense (Médico, Psicólogo y S. Social)
- ✓ Mandamientos y Notificaciones
- ✓ Depósito de Elementos Secuestrados
- ✓ Centro de Cableado
- ✓ Sanitarios Hombre/ Mujer/ Inclusivo
- ✓ Garita Policial
- ✓ Oficina de Reserva
- ✓ Patio central y auxiliares


El intendente de Saladas envió al STJ la ordenanza N° 00180/21 por medio de la cual el Consejo Deliberante de esa localidad declara de interés municipal la construcción de la ciudad judicial en el predio donado al efecto.

-Ituzaingo: RECUPERACIÓN EDIFICIO E.B.Y., SUPERFICIE: 2.636 m2, PLAZO DE OBRA: 420 DÍAS, MONTO DE OBRA: \$ 199.694.000.

PLANTA BAJA

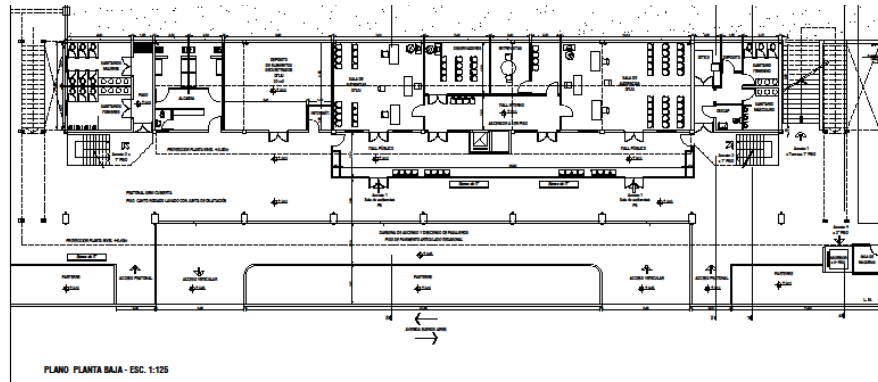

PRIMER PISO

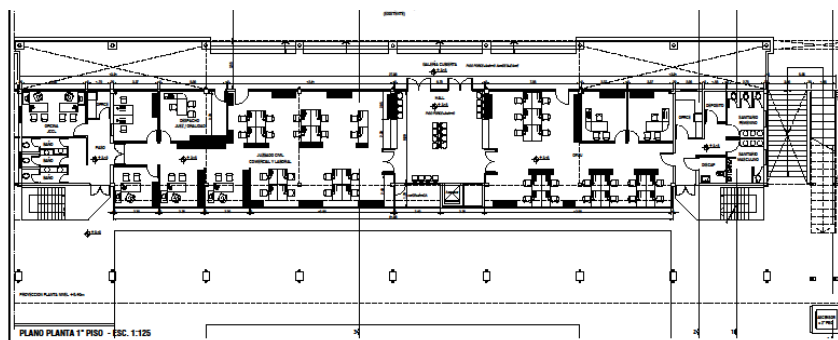




Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

SEGUNDO PISO

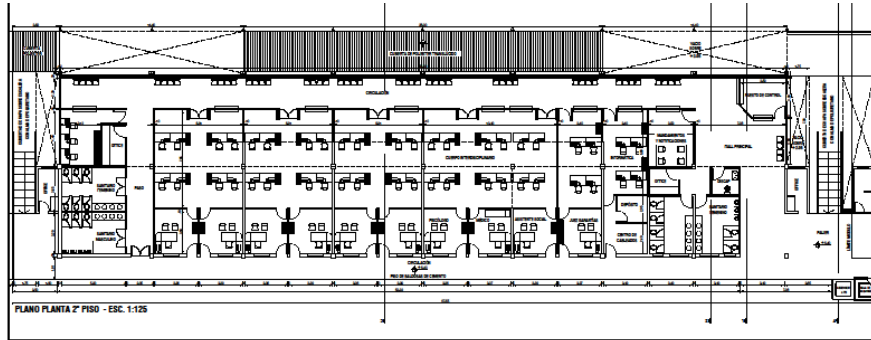


Describe el Dr. Panseri que, este gran edificio hace más de 14 años no está en uso, se aprovechará la parte dada en comodato para alojar a la Oficina Judicial, Juzgado de Garantías, Juzgado Civil y Cuerpo Forense, dejando la estructura vieja, hoy en Juzgado de Garantías y Juzgado Civil, solo para el Ministerio Publico. El mencionado edificio viejo será remodelado a partir del 1 de febrero del año próximo y ampliado a fin de dejar en condiciones de la puesta en funcionamiento del CPPC. La obra se lleva acabo con el personal de INVICO bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial. Y a partir del 1 de enero se realizarán cambios en la actual estructura edilicia de la Fiscalía por un monto superior al 1.800.000,00.

-Capital: OBRA NUEVA, SUPERFICIE: 1600 m², PLAZO DE OBRA: 420 DÍAS, MONTO DE OBRA: \$ 199.088.996,28.




Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

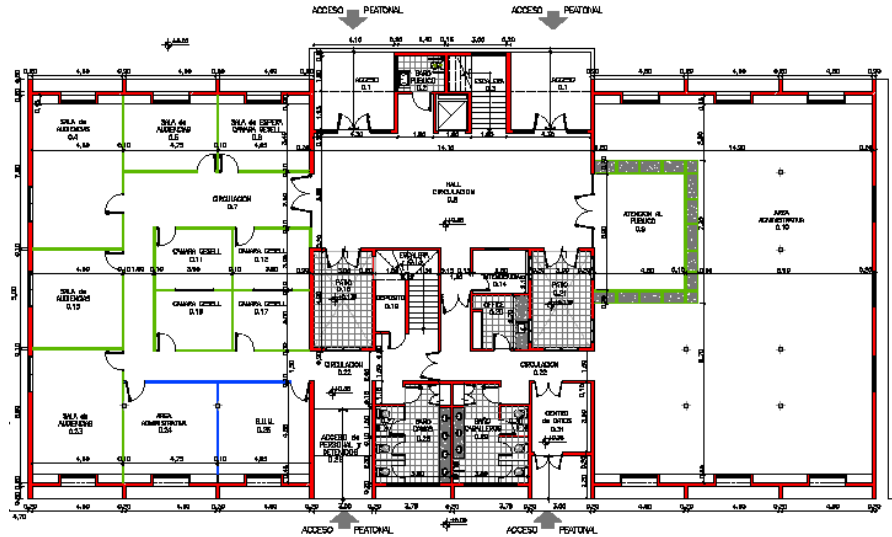

PLANTA BAJA: OFI.JU., 4 SALAS DE AUDIENCIA y 2 CÁMARAS GESELL.

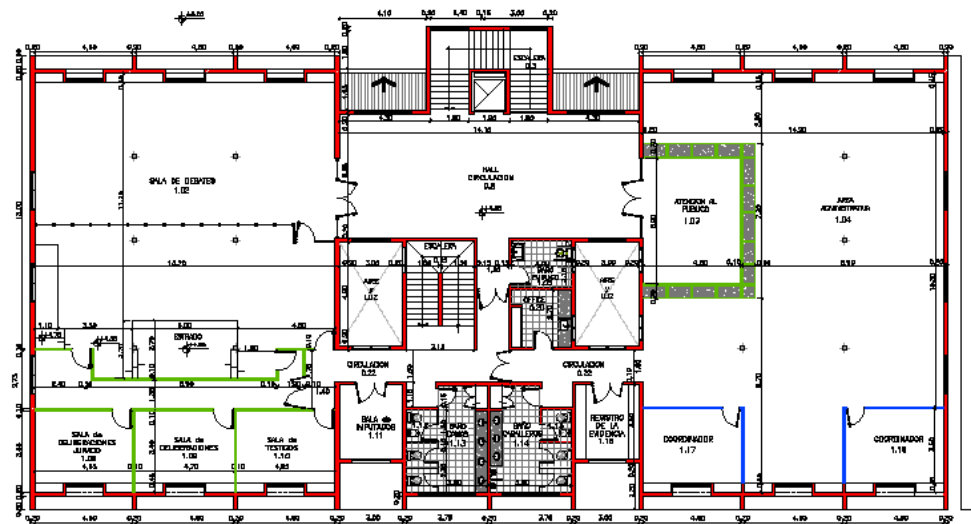

PLANTA ALTA: SALA DE DEBATES, 2 SALAS DE DELIBERACIONES y 1 SALA DE TESTIGOS.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Manifiesta al respecto el Dr. Panseri que ya se inició el proceso de licitación con aperturas de 7 sobres al martes pasado. Se iniciará en módulos la construcción, el primero comprenderá la alcaidía para 24 detenidos, la Ofiju y salas de audiencia; el segundo módulo las oficinas de los 16 jueces, con sus despachos y una zona común o área de trabajo para todos los asistentes de los jueces, en total serían 8 jueces en cada, hall de recepción, baños hombre, mujer e inclusivo; un tercer módulo para el Ministerio Público, Fiscales para albergar a 16 fiscales, 8 por piso, con sus salas de entrevistas unilaterales 8 en total. El cuarto módulo, será para Defensoría y Asesoría. Quedaría el quinto modulo para menores y el cuerpo forense Los actuales elementos secuestrados de los galpones hoy ocupados por esos elementos serán trasladados al predio Ex Zarpa.

-Santa Rosa: OBRA CON PERSONAL D.A.M.I, JUZGADOS CIVIL, COMERCIAL, DE INSTRUCCIÓN. DEFENSORÍA OFICIAL PENAL. FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN. Remodelación y ampliación a iniciarse el año que viene para oficinas del Ministerio Público, Cámara Gessell y destacamento policial, trabajo realizado en colaboración y cooperación, municipio, provincia y Poder Judicial.

Se agrega que ni bien se terminen los proyectos mencionados se inician los segundos proyectos para completar el traslado de las oficinas judiciales de Monte Caseros, Bella Vista, Saladas y Capital. Creyendo que para fines del año que viene se comenzarían los proyectos de Paso de los Libres. Santo Tome. Virasoro y Mercedes. Y en nivel de Juzgados de Paz, para culminar con San Luis del Palmar, Mocrete, La Cruz, Colonia 3 Abril y General Paz. **Todo para el presente año, y los años 2022-2023.**



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Llevamos en obras considerando 1.200 millones de pesos, de los cuales 500 fueron gastados, fruto del trabajo de la Dirección de Administración en reducir las partidas, bajar los costos. Queda pendiente el Juzgado de San Luis del Palmar (ya se inició la obra, Mocrete, transformados en civiles. Agrega el Dr. Panseri que se sometió a remodelación el tercer piso de la Casa Lagraña, Área de informática, el cual llevo el gasto a 600 millones. Tanto la Dirección de Arquitectura como la de Administración por todo lo expuesto, se encuentran trabajando al límite de sus posibilidades.

Dr. Robineau toma la palabra a fin de saludar y expresar su acompañamiento en este proceso de implementación, junto con el Dr. Ortega que manifiesta estará atento al avance las obras en ejecución y por ejecutarse. Destaca el trabajo realizado considerando la situación de pandemia imperante que conllevo recortar medios económicos y trabajar con lo que se tuvo y se tiene. Dr. Marcelo Chain, informa que es la primera vez en democracia en este lapso de tiempo, se crece en reformas constitucionales y procesales, penal, civil, de familia, laboral y administrativo, están sancionados y solo queda en Cámara de Diputados el laboral. En lo que queda del año se constituirá una comisión del Código Procesal Juvenil. No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 9.38 hs.

Dr. Eduardo G. Panseri
Ministro Superior Tribunal de Justicia
Provincia de Corrientes
